


粒度試験総括表

工事名 LLKLLK 施工者 _____

工 種 _____ 試験者 鈴木 一郎

	2.36 mm			0.075 mm	
	実際粒度	予定粒度		実際粒度	予定粒度
最 大	36.0 %	%	最 大	8.0 %	%
最 小	28.0 %		最 小	4.0 %	
平 均	32.2 %		平 均	6.6 %	
		± %		± %	

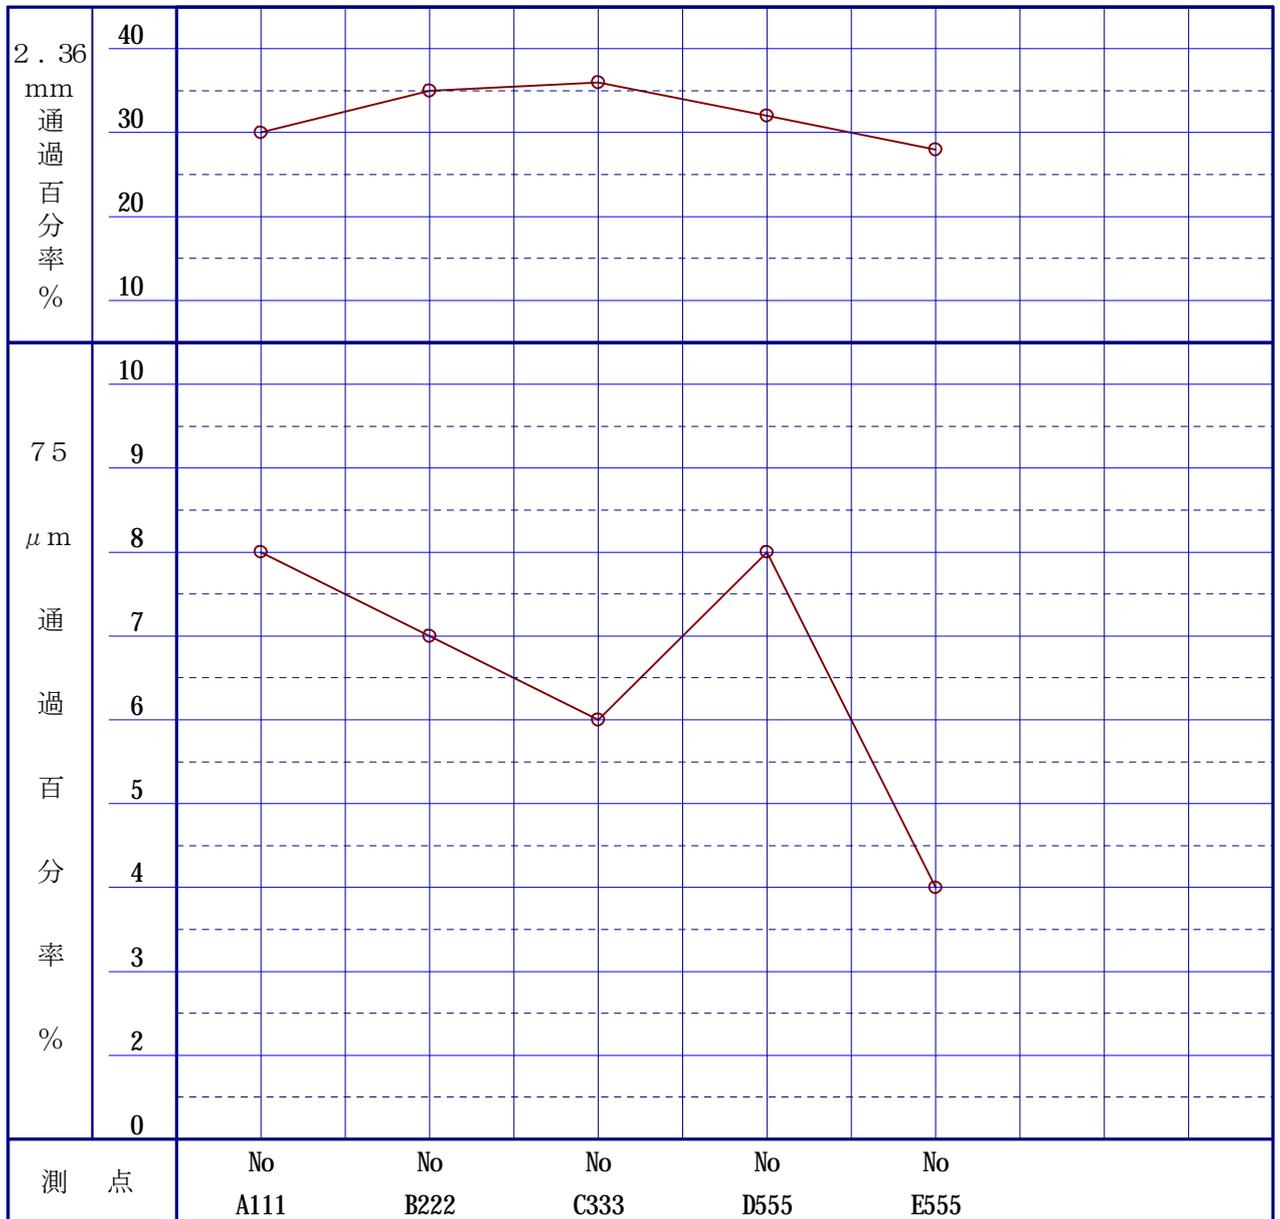

骨材の粒径加積曲線図

(合成粒度)

試験報告用紙

混合物の種類 粒調砕石 30m/m

試験年月日

10年 10月 10日

事業名 LLKLLK

砕石の産地 南州砕石


路線名 10

砂の産地 ええええええええええええええええ

箇所名 10

試料採取位置 No.1

試験者 鈴木 一郎

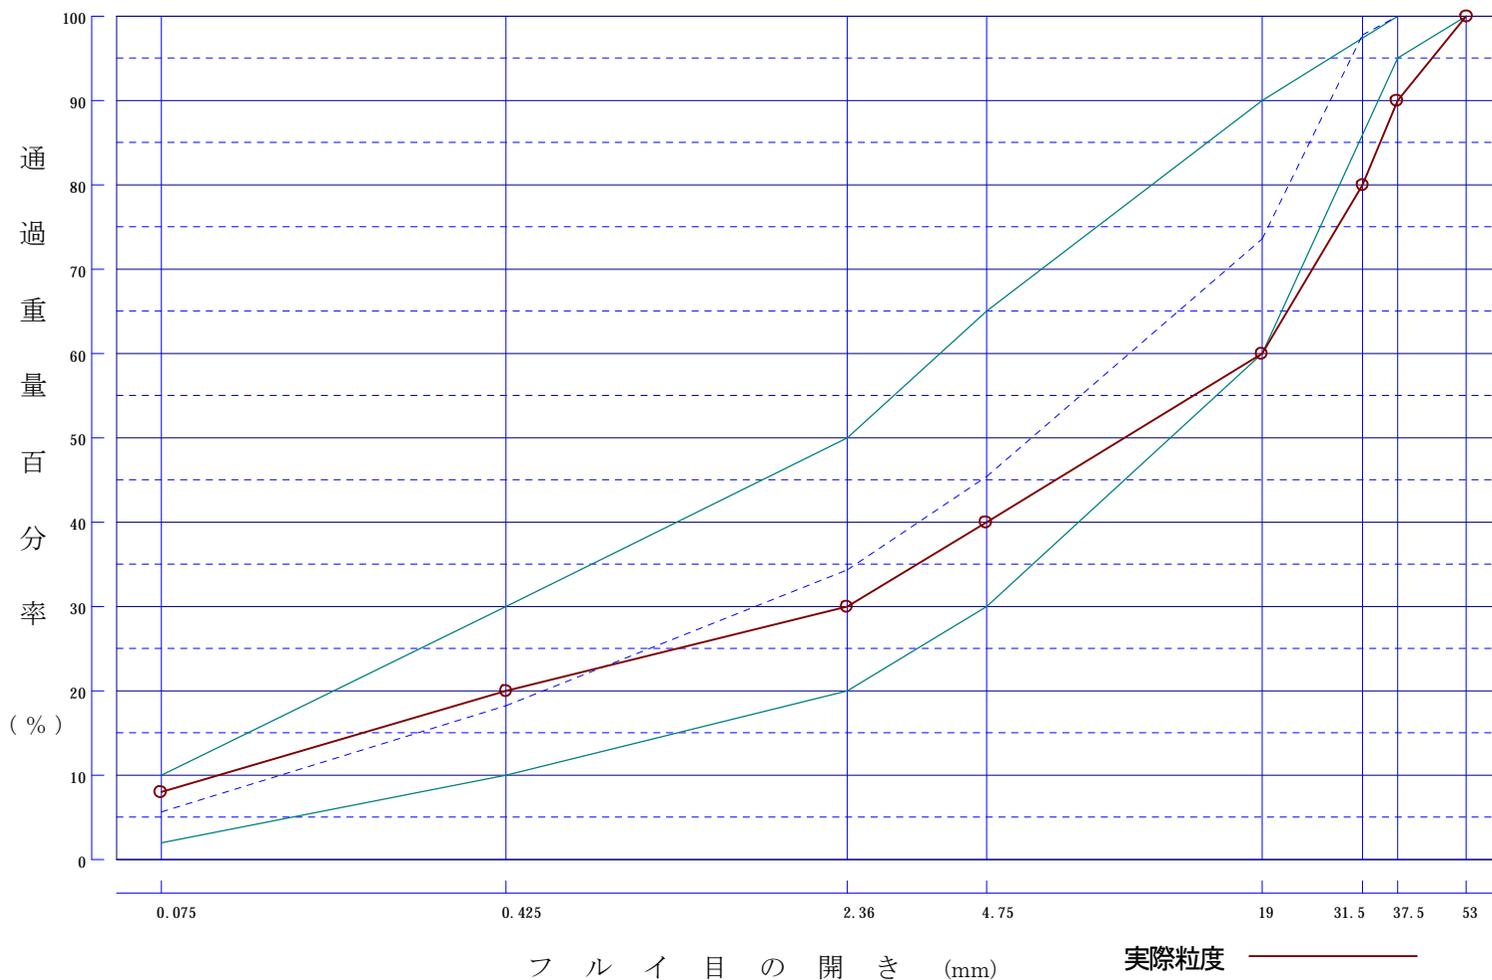

呼び寸法 (mm)	通過重量百分率 (%)			
	(g)	(%)	予定粒度	粒度範囲
63.0				
58.0	15544	100.0	0.0	~100
37.5	13989	90.0	100.0	95~100
31.5	12440	80.0	97.8	~
26.5				
19.0	9330	60.0	73.6	60~ 90
16.0				
13.2				
9.5				
4.75	6214	40.0	45.4	30~ 65
2.36	4667	30.0	34.3	20~ 50
1.18				
0.6				
0.425	3108	20.0	18.2	10~ 30
0.3				
0.15				
0.075	1244	8.0	5.6	2~ 10

フルイ目の開き (mm)

実際粒度 ————
 予定粒度 - - - - -
