【ピーシー・ネットワーク ホームページ】click!! ⇒ http://www.pcn-soft.com/

JIS A 1215	道 路 の 平 板 載 荷 試 験	

調査件名 ○○地区土質調査 SI　　試験年月日 平成 17 年 07 月 30 日

地点番号（地盤高）T1-1 (1.00mm)　　試 験 者 ピーシー・ネットワーク

載荷板の形状	鋼製円盤	載荷板の直径 cm	30	載荷板の面積 A m²	0.0707
ジャッキの種類	ｽｸﾘｭｰｼﾞｬｯｷ	ジャッキの能力 kN	200	反力装置の種類	ダンプトラック
荷重計容量 kN	50	荷重計の較正係数 K kN/m²/目盛	2.98	天 候	晴れ
計算に用いた沈下量 S mm	1.25	荷重強さ p kN/m²	128.4	地盤反力係数Ks MN/m³	102.7

時 間	荷重計の読み R	荷重強さ p=KR kN/m²	変位計の読み mm 1	2	3	4	沈下量 mm
10:05:00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:09:30	11.7	34.9	0.35	0.37	0.35	0.37	0.36
10:13:00	23.5	70.0	0.67	0.69	0.67	0.69	0.68
10:18:00	35.2	104.9	1.01	1.05	1.01	1.05	1.03
10:19:30	46.9	139.8	1.37	1.40	1.37	1.35	1.37
10:23:00	58.6	174.6	1.79	1.82	1.79	1.82	1.81
10:28:30	70.4	209.8	2.26	2.29	2.26	2.29	2.28
10:33:00	82.1	244.7	2.80	2.84	2.80	2.84	2.82
10:38:30	93.8	279.5	3.51	3.54	3.51	3.54	3.53

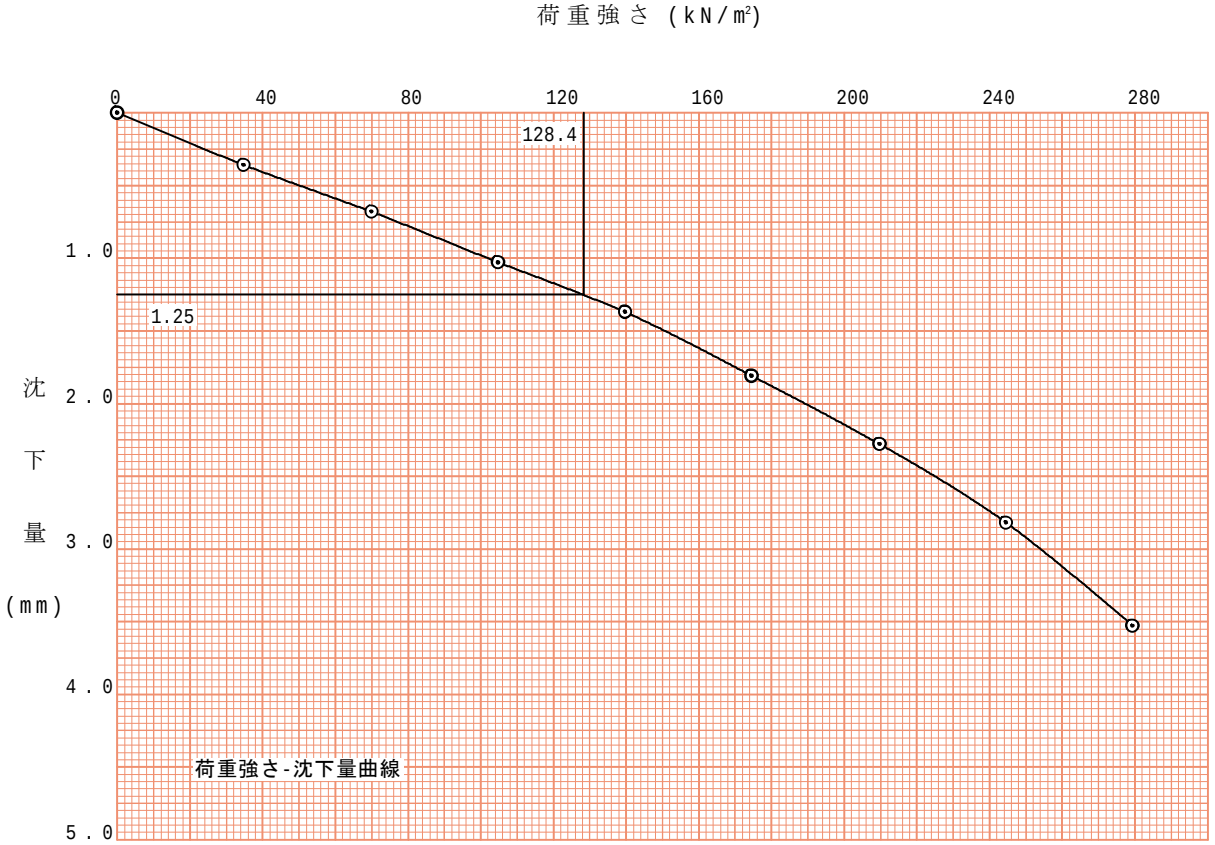

特記事項　特記事項１項目のサンプル印字1111111111111111111111111111111111111　Ks = p/S
特記事項２項目のサンプル印字おおおお
